





RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DE OBRAS - CURVA "S"


7-abr-2017

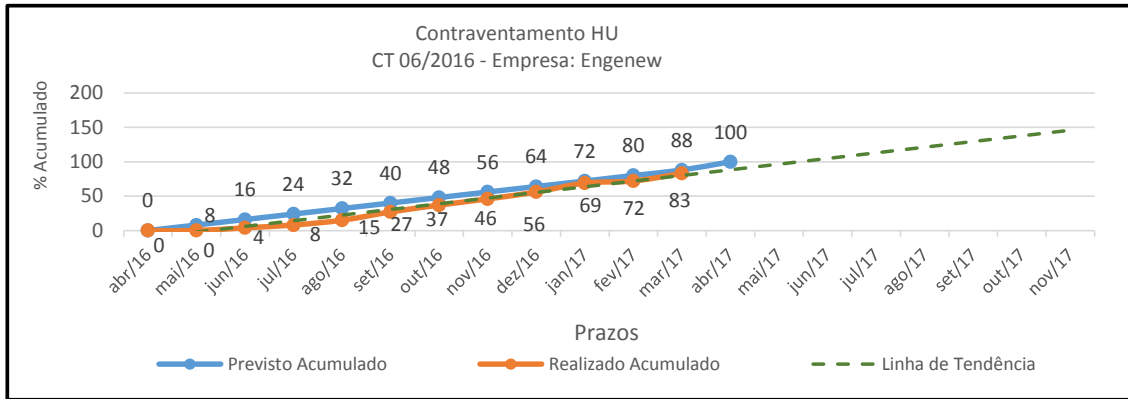

Percentual de Atraso Contraventamento HU 17%

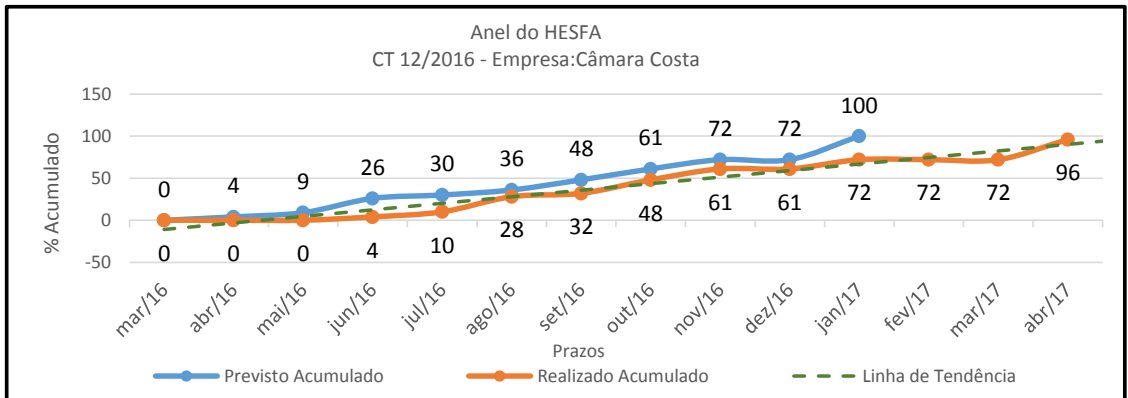

Percentual de Atraso Anel do HESFA 4%

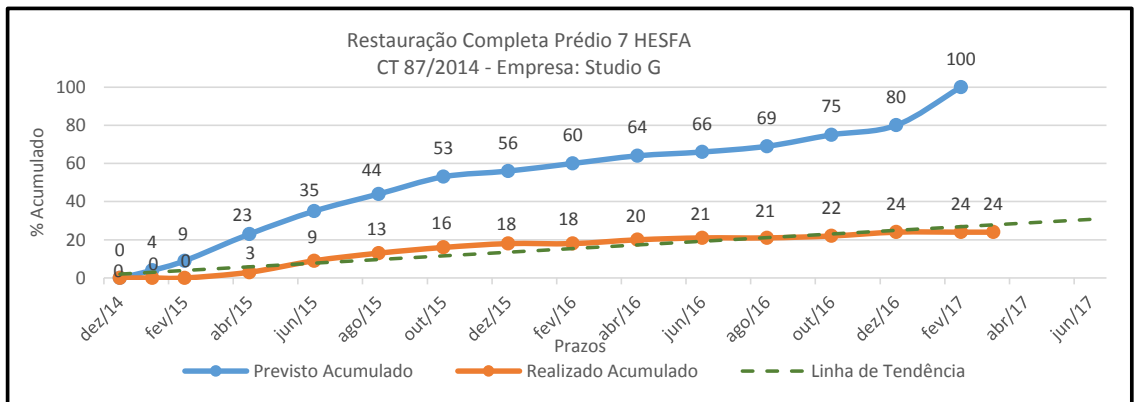


Percentual de Atraso Prédio 7 HESFA 76%




RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DE OBRAS - CURVA "S"


7-abr-2017

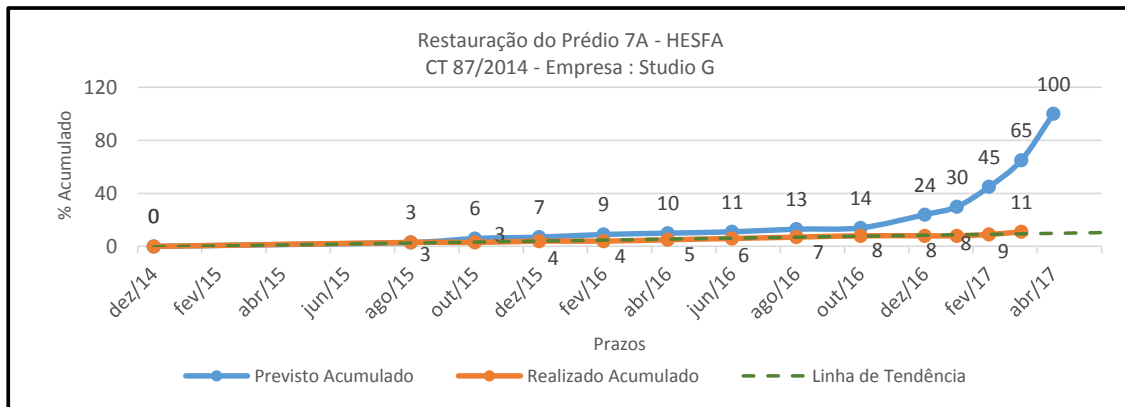

Percentual de Atraso Prédio 7A HESFA **89%**

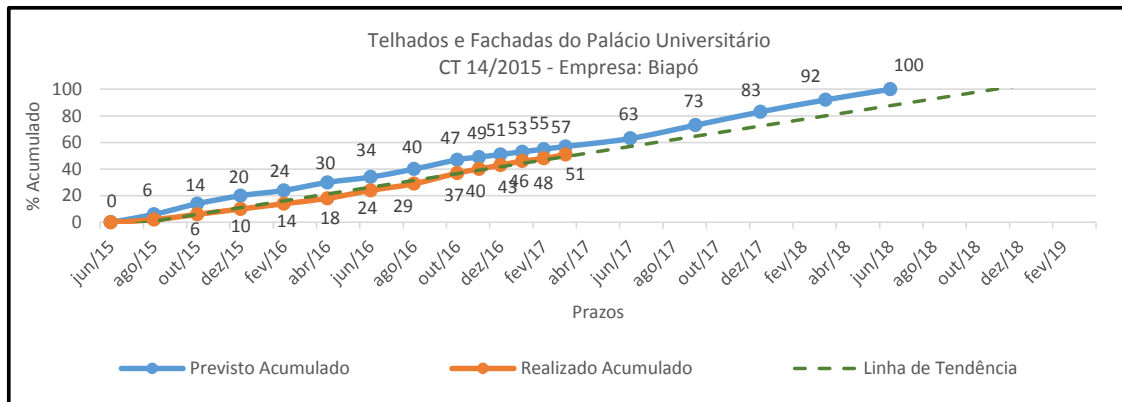

Percentual de Atraso Telhados e Fachadas Palácio **11%**

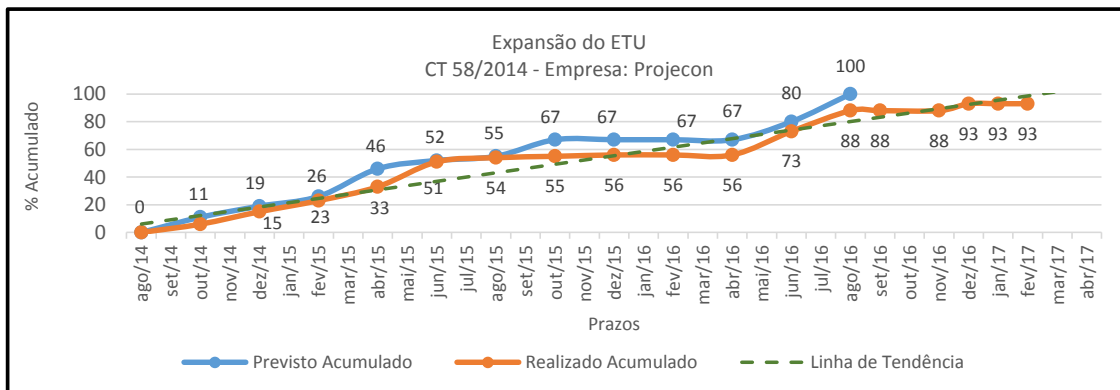


Percentual de Atraso Expansão do ETU **7%**




RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DE OBRAS - CURVA "S"


7-abr-2017

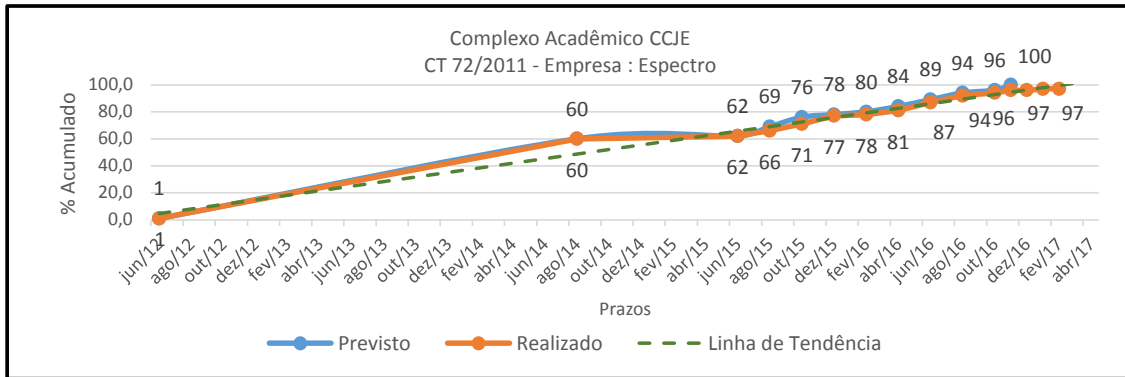

Percentual de Atraso - CCJE **2%**

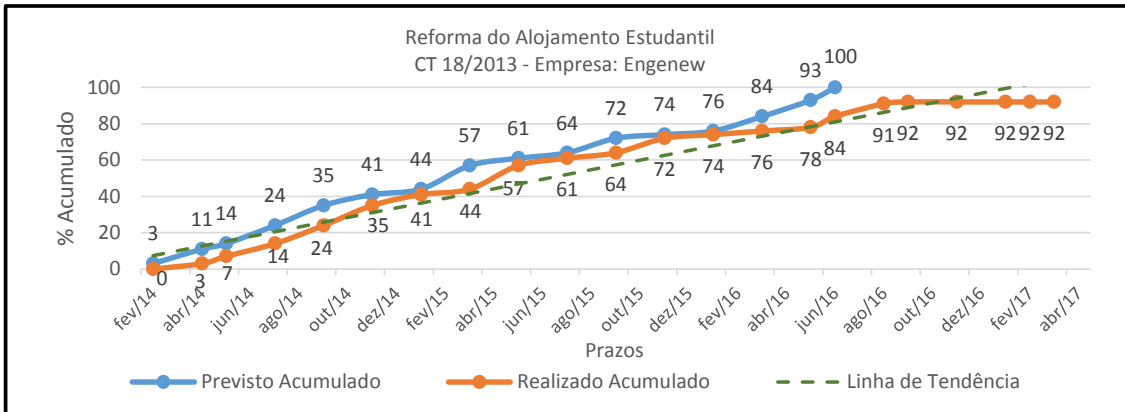

Percentual de Atraso Reforma do Alojamento **8%**

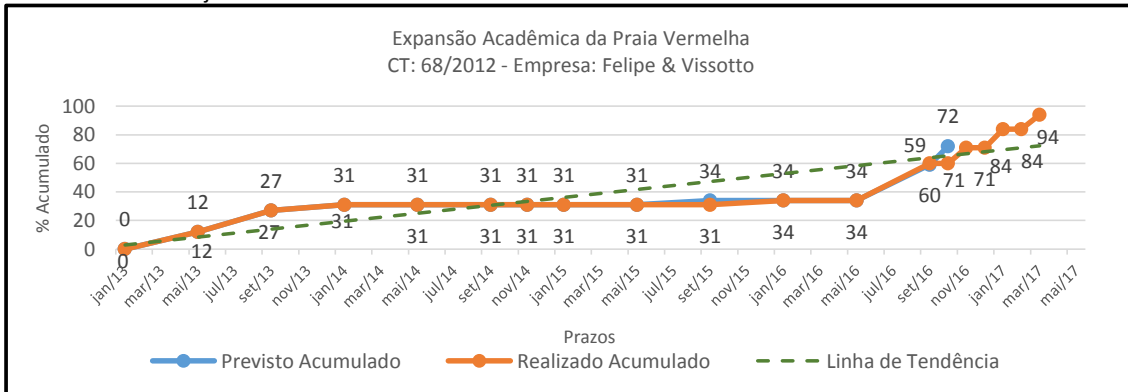


Percentual de Atraso Ex. Acad. Da Praia Vermelha **6%**




RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DE OBRAS - CURVA "S"

7-abr-2017

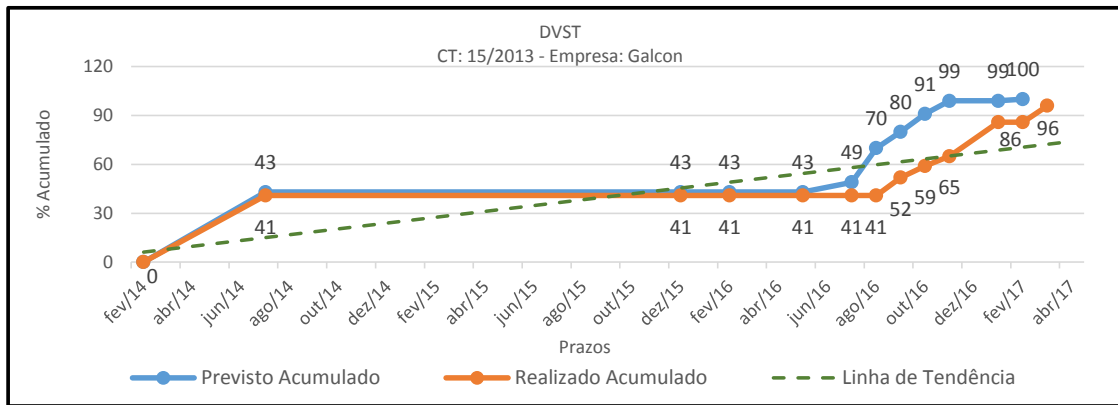

Percentual de Atraso DVST

4%

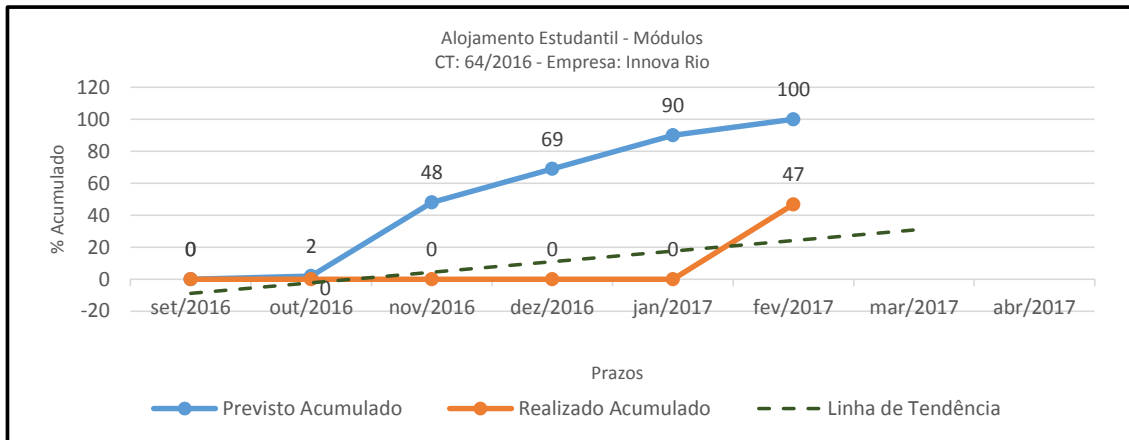

Percentual de Atraso Alojamento Estudantil

53%
